

Bogotá D.C.

Señor(a)

ANÓNIMO

Correos: david.forero4556@hotmail.com

Referencia: Radicado MinTIC No. 241026279 del 09/04/2024

Respetado(a) señor(a),

Reciba un cordial saludo de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

En atención al comunicado de referencia de manera atenta le informamos lo siguiente frente a cada una de sus solicitudes:

1. Informar la fecha del tiempo de reposición de los beneficiarios que no han prestado el servicio

Rta/ En el archivo "fecha fin operación beneficiarios" se encuentran incluido el tiempo de reposición establecido en el acuerdo conciliatorio para instituciones públicas, para los demás beneficiarios a la fecha no se tiene definida una fecha dado que no se han formalizado los tiempos de reposición para cada beneficiario, como resultado de la aplicación de los procedimientos de reposición establecidos contractualmente.

2. Estado de la ejecución presupuestal del proyecto

Rta/ El estado de ejecución presupuestal del contrato de aporte con corte 31 de marzo es el siguiente:

Concepto	Valor (\$)
Valor Total desembolsado a marzo de 2024	370.058.614.737,00
Ejecución Contrato No 00875 – 2013	
Valor Ejecutado en Utilizaciones Incluido GMF a 29 de febrero de 2024	317.995.693.808,92
Valor Ejecutado del Anticipo	9.213.453.150,00
Total, Ejecutado a 29 de febrero de 2024	327.209.146.958,92
Valor Pagado Órdenes de Pago marzo de 2024 -	4.569.412.017,26
GMF del valor pagado de marzo de 2024	18.277.649,000
Valor pagado con GMF marzo de 2024	4.587.689.666,26
Valor ejecutado total proyecto	331.796.836.625,18
Saldo por ejecutar (*)	38.261.778.111,82
Saldo en Fideicomiso reportado por Fiduciaria Bogotá con corte al 31 de marzo de 2024 (**)	38.237.380.910,82
(*) Valor que incluye un valor pendiente por autorizar de \$ 29.927.437.851,07 y un valor autorizado por utilizar de \$	

8.334.340.260,75

(**) El saldo indicado no incluye el valor de los rendimientos generados en el mes de marzo de 2024 y la provisión para el pago de las retenciones de la OP 2713, por valor de \$24.937.201 incluido GMF

3. Estado de la instalación de los beneficiarios

Rta/ El estado de los beneficiarios del PNCAV a corte del 31 de marzo de 2024 es el siguiente.

淨

ÍTEM	BENEFICIARIOS									
	KVD				IP	PVD	PVD PLUS	ZONA WIFI	Accesos Internet Hogares	TOTAL
	IE	PNN	GM	CI						
CANTIDAD	929	8	9	7	235	52	4	57	11.780	13.081
EN INSTALACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUESTOS EN SERVICIO	313	1	6	0	215	28	3	46	9.584	10.196
APROBADOS	294	1	6	0	215	26	3	46	9.584	10.175
EN OPERACIÓN	292	1	6	0	215	26	3	46	9.584	10.173
FINALIZACIÓN OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% AVANCE APROBADOS	31,65%	12,50%	66,67%	0,00%	91,49%	50,00%	75,00%	80,70%	81,36%	77,77%

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

CANTIDAD: Número de Beneficiarios establecidos contractualmente en el Proyecto.

EN INSTALACIÓN: Beneficiarios en proceso instalación y/o instalados pendientes de poner a disposición por Operador. Los datos reportados corresponden a los reportes realizados por la Unión Temporal Andired en las reuniones de seguimiento de Infraestructura y Beneficiarios. El detalle en recuadro al lado

ENTREGADOS: Beneficiarios puestos a disposición por parte del Operador. A la fecha se encuentra en verificación 7 KVD por parte de la interventoría

APROBADOS: Beneficiarios Aprobados por parte de la Interventoría.

EN OPERACIÓN: Beneficiarios que se encuentra en Operación.

FINALIZACIÓN OPERACIÓN: Beneficiarios que terminaron la etapa de Operación.

IE: Institución Educativa

PNN: Parques Nacionales Naturales de Colombia

GM: Guarnición Militar


CI: Comunidad Indígena.

4. Estado de la operación del proyecto


De conformidad con lo establecido en el numeral 1.3. CRONOGRAMA Y PLAZO del Contrato de Aporte 0875 de 2013, la etapa de Operación, administración, mantenimiento de la Red y gestión de los servicios será de ocho (8)

años posterior al recibo a satisfacción, en tal sentido, se describen a continuación los aspectos correspondientes a dicha fase del proyecto, en atención a los aspectos relacionados con la operación de la red y la gestión del servicio, dispuestos tanto en el literal ss del ítem 1.2.2 – Técnicas de las obligaciones de la Interventoría, establecidas en el numeral .1.2, como en el acápite 2.2.3 – Indicadores de calidad y disponibilidad, del Anexo técnico del contrato de interventoría No. 1275 de 2023.

A continuación, se presentan los resultados históricos del periodo junio 2023 hasta octubre 2023 de los cuales la Interventoría ha emitido su respectivo concepto, y adicionalmente los resultados parciales de noviembre 2023 hasta febrero 2024:

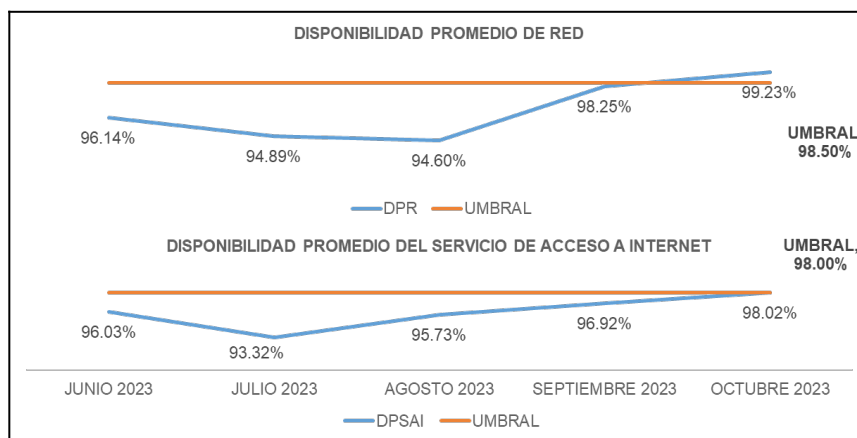

Gráfica No. 1 Resultados conceptuados RED y Disponibilidad Promedio del Servicio de Acceso a Internet -DPSAI

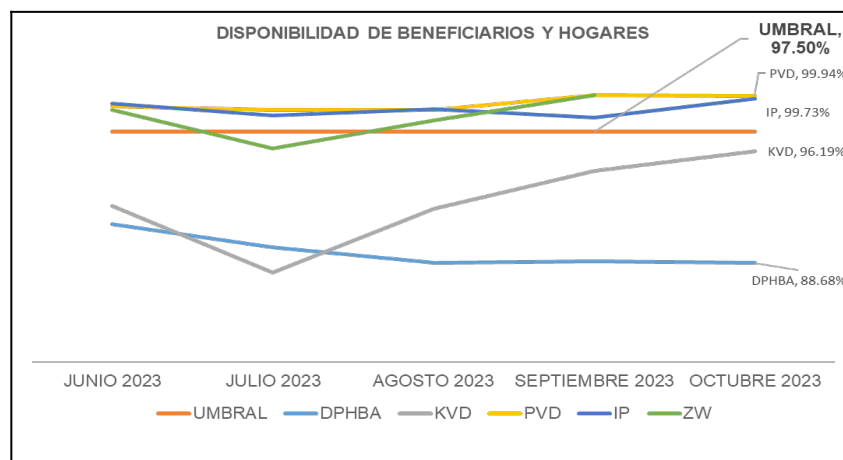

Gráfica No. 2 Resultados conceptuados Beneficiarios

MES	DPR	DPSAI	DPHBA
NOVIEMBRE 2023	98,69%	98,51%	88,32%
DICIEMBRE 2023	98,98%	98,04%	86,65%
ENERO 2024	98,28%	97,23%	85,35%

MES	DPR	DPSAI	DPHBA
FEBRERO 2024	98,14%	93,79	85,31%
*Los resultados en color rojo no han alcanzado el umbral mínimo de cumplimiento.			

5. Estado del pago realizado a los gestores

Rta/ Para el periodo de mayo de 2017 a marzo de 2024, el Operador ha presentado soportes de los pagos a los gestores que corresponden al 30%. El porcentaje de los pagos pendientes distribuidos por año se presentan en la siguiente tabla:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% pago pendiente	100%	37%	42%	57%	64%	93%	100%	100%

Sin embargo, se aclara lo siguiente:

1. El Operador ha socializado en varias instancias que se encuentra al día con los pagos a los gestores TIC de 2017, a la fecha tiene pendiente la entrega de los soportes.
2. Mediante comunicado PNCAV-LKT-FIDU-0013-24 con el MinTIC 241022114 del 22 de marzo de 2024, la Interventoría aprobó la Orden de pago 2713 a nombre de la Fundación Lazos de Orgullo, con la que el Operador tiene programado avanzar con el pago de gestores pendiente.

6. Hasta cuándo va la operación del PNCAV?

Rta/ Se adjunta excel denominado “fecha fin operación beneficiarios” con la fecha de finalización contractual para cada uno de ellos

7. Con qué recursos se va a cubrir los pagos pendientes?

Rta/ Operador Andired, buscara los recursos propios para cumplir con los pagos pendientes.

Sin otro particular, esta dirección quedará atenta a cualquier aclaración que al respecto estime conveniente.

Cordialmente,

Dirección de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 Tel. + (571) 344 34 60
 Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13
 Código postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia
 Correo: minticresponde@mintic.gov.co
www.mintic.gov.co
